

KEURINGSVERSLAG VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 16/10/2025) – ALGEMENE DIRECTIE ENERGIE - HUISHOUDELIJKE INSTALLATIE**Basis van het onderzoek: Controlebezoek van een bestaande installatie volgens boek 1: Deel 6 hoofdst. 6.5****Bijkomende / afwijkende beschikking: Bestaande gedeelten van huishoudelijke elektrische installaties uitgevoerd vanaf 1 juni 2020 (Deel 6 hoofdstuk 6.5 afd. 6.5.8.1 sub. 1) en Bestaande gedeelten van huishoudelijke elektrische installaties uitgevoerd vanaf 1 juni 2020 (Deel 6 hoofdstuk 6.5 afd. 6.5.8.1 sub. 2-3)**

Ref:	Dossiernr:	Aanvrager:
Datum: 06/05/2026	KEA2602926	van Lommel Joseph
	Verslagnr: KV25837-IDE	Inspecteur: Ivan Deckers
Installatie	Eigenaar en/of beheerder	Verantwoordelijke werken
Huishoudelijke installatie	van Lommel Joseph	Onbekend
Burgemeester Adriaensenlaan 72	Burgemeester Adriaensenlaan 72	
2450 Meerhout	2450 Meerhout	
	Tel:	

Bouwjaar van de initiele installatie (*) : Tussen 1981 en 01/06/2020
(*) Volgens verklaring van de klant**De installatie voldoet.**
Dit keuringsattest is geldig tot 06/05/2051**Algemene gegevens elektrische installatie****Gegevens verdeler**EAN: 541448820030361096
kWh meter nr.: ILGZ0584059598Bescherming aansluiting: 20 A
Meterstand dag: 554 kWh☐ Budgetmeter
Meterstand nacht: kWh**Gegevens installatie**Ontworpen voor: 3N400V
Max nominale stroom: 40 AVoedingsleiding hoofdbord: 4 x 10 mm²
Type voedingsleiding: VOB

Type aardelektrode: pen/baar

Beschrijving installatie

Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA

Aantal schakelborden: 2

Aantal eindstroombanen: 35

Schakelborden: zie bijlage stroomkringen

Schakelborden: zie bijlage stroomkringen

Controles

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☒ Toestellen
☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schemas	☒ Controle foutlus
☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test DSI	☒ Differentieelstroomrichting: werd verzegeld	

Metingen

☒ Aardingsweerstand: 13.59 Ohm☒ Algemeen isolatieniveau: Geen mogelijkheid om te meten

Inbreuken

Inbreuken bestaande installatie

Geen geconstateerd

Opmerkingen

W020 - Huis was gemeubeld op het moment van het controlebezoek.

G004 / L011 zolder

H012 garage

Controle enkel uitgevoerd op de zichtbaar en bereikbare delen.

De klant/vertegenwoordiger verklaart dat de installatie na keuring opnieuw functioneel is.

KEW 0001332: 00

Besluit

De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 06/05/2051

Bijlagen

1. Eéndraads- en installatieschema (5 pagina's)



Digitaal ondertekend
03/06/2026
Ivan Deckers

De eigenaar, beheerder of uitbater van een huishoudelijke elektrische installatie is ertoe gehouden:

1. De goede staat van onderhoud te verzekeren of te laten verzekeren;
2. De geschikte maatregelen te treffen zodat de voorschriften van dit Boek op ieder ogenblik worden nageleefd;
3. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
4. Een kopie van het dossier van de elektrische installatie ter beschikking te stellen van de eventuele huurder;
5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

Het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen van de elektrische installatie worden aan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van de elektrische installatie overhandigd om deel uit te maken van het dossier van de elektrische installatie. Een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen worden bewaard gedurende vijf jaar door voormeld erkend organisme zoals vermeld in onderafdeling 6.4.6.1. Gedurende de voormelde periode, kan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van de elektrische installatie bij het betrokken erkend organisme verzoeken om een duplicaat van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen te krijgen. Voor het ter beschikking stellen van een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen mag een vergoeding worden gevraagd, waarvan het bedrag door het erkend organisme wordt vastgelegd. De vergoedingen die eventueel worden aangerekend voor het ter beschikking stellen ervan mogen de kostprijs van een controle niet overschrijden.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

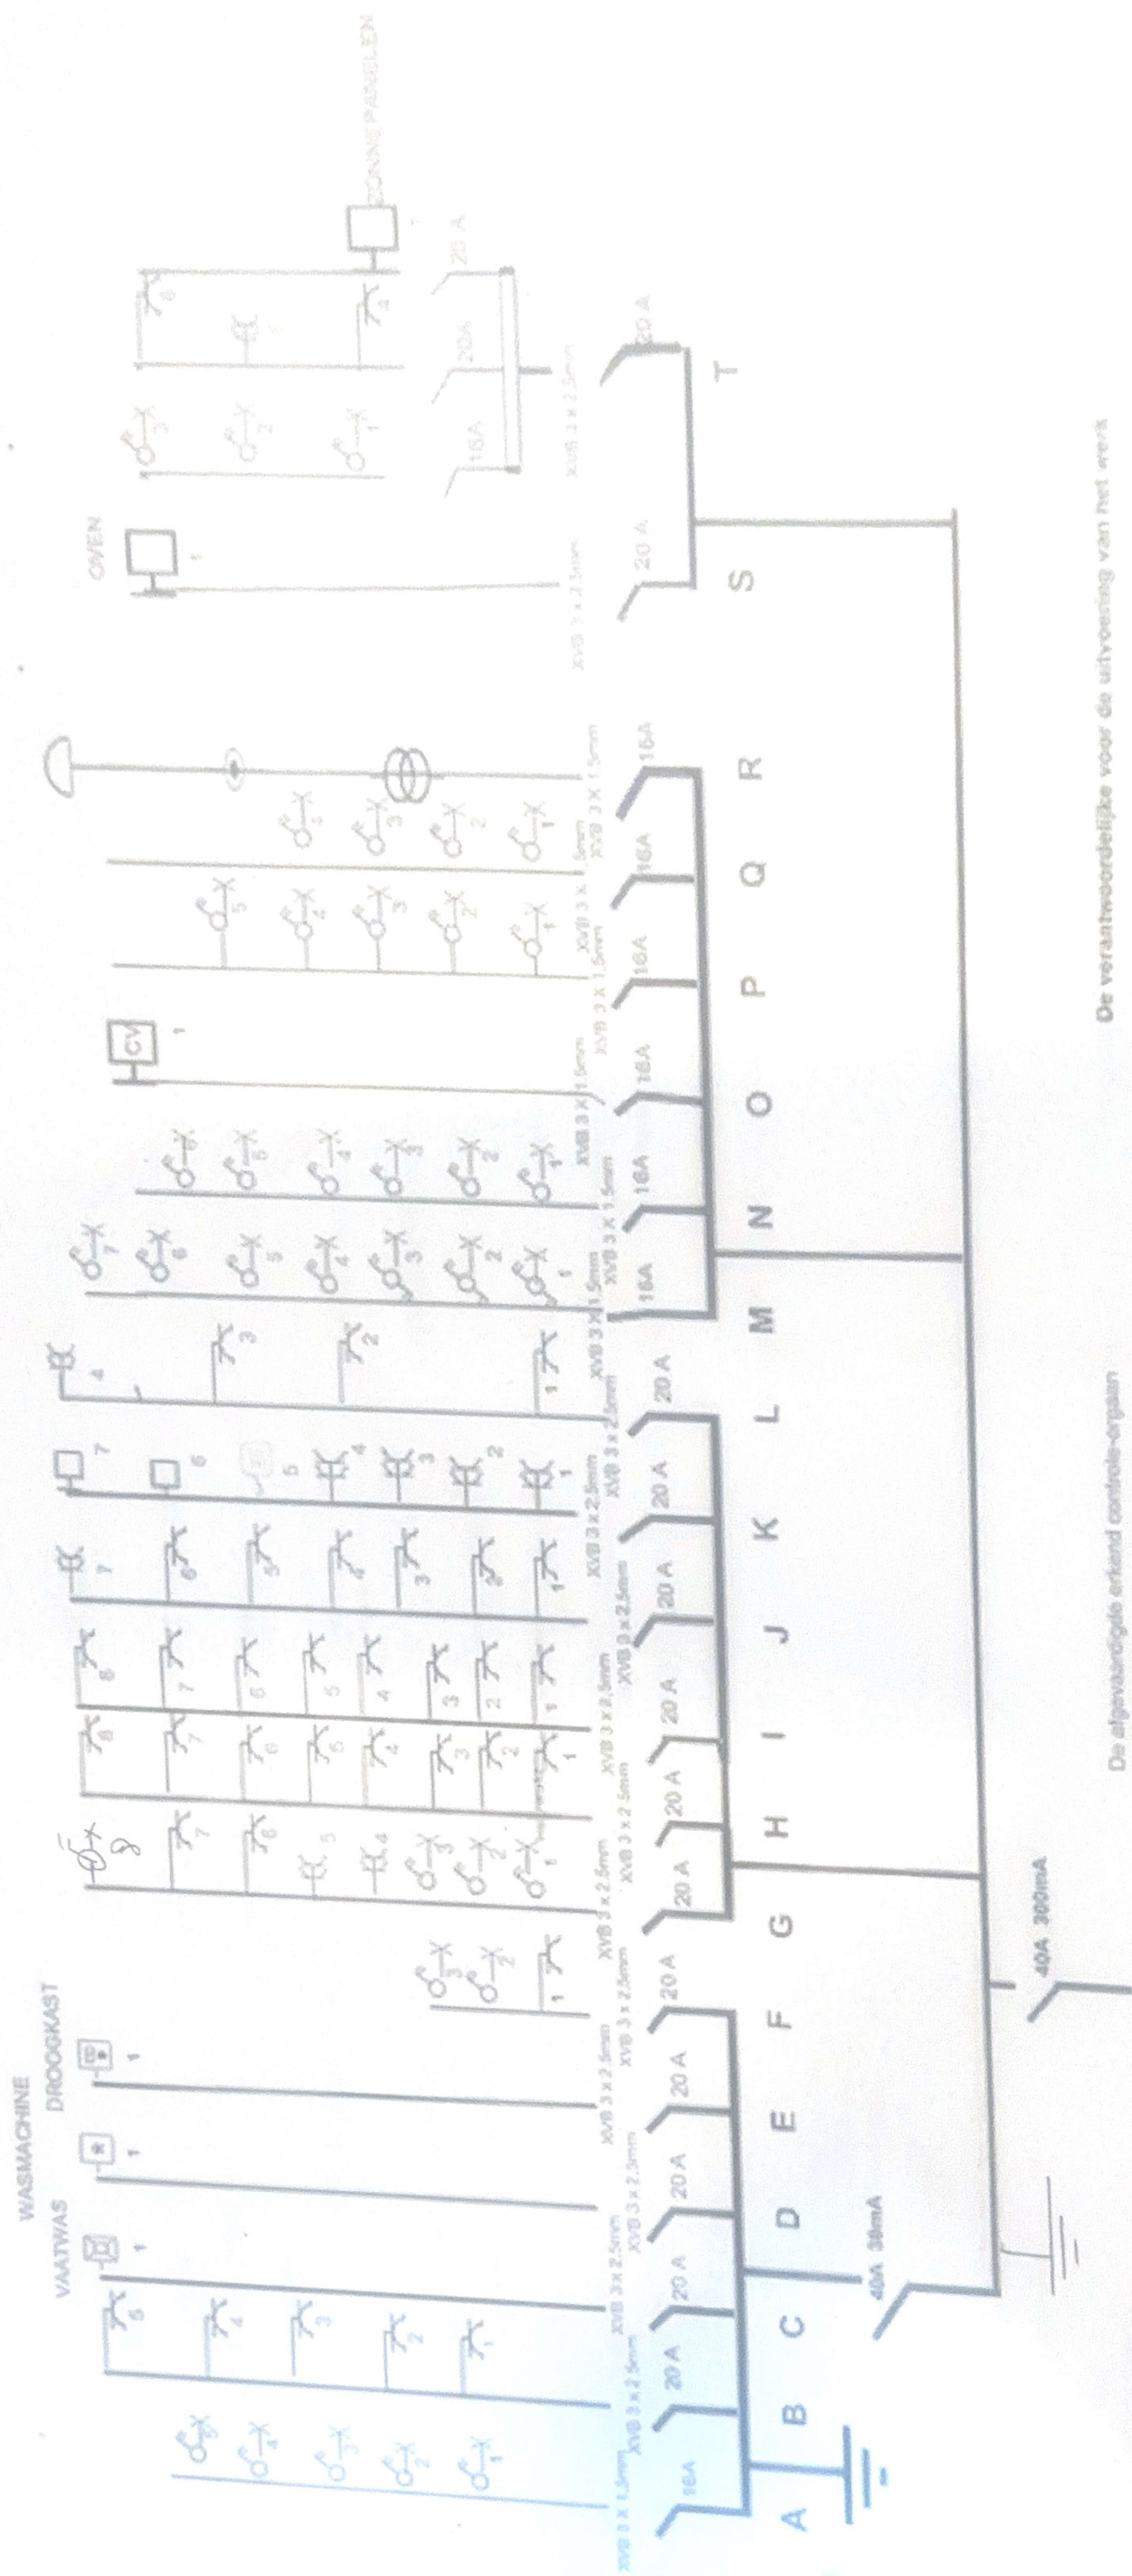

De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

VAN LOMMEL JOSEPH

25.04.2026


De algemene vergadering erkent controle-organen
KEA Keuringen en energie Advies vzw
van Deckers

EENDRAADSSCHEMA
Bouwheer: VAN LOMMEL J.
Adres: MEERHOUT 2480
BURGEMEESTER
ADRIAENSEN JAAN

24

EAR 5414 40020705 1295

Blað 1/6

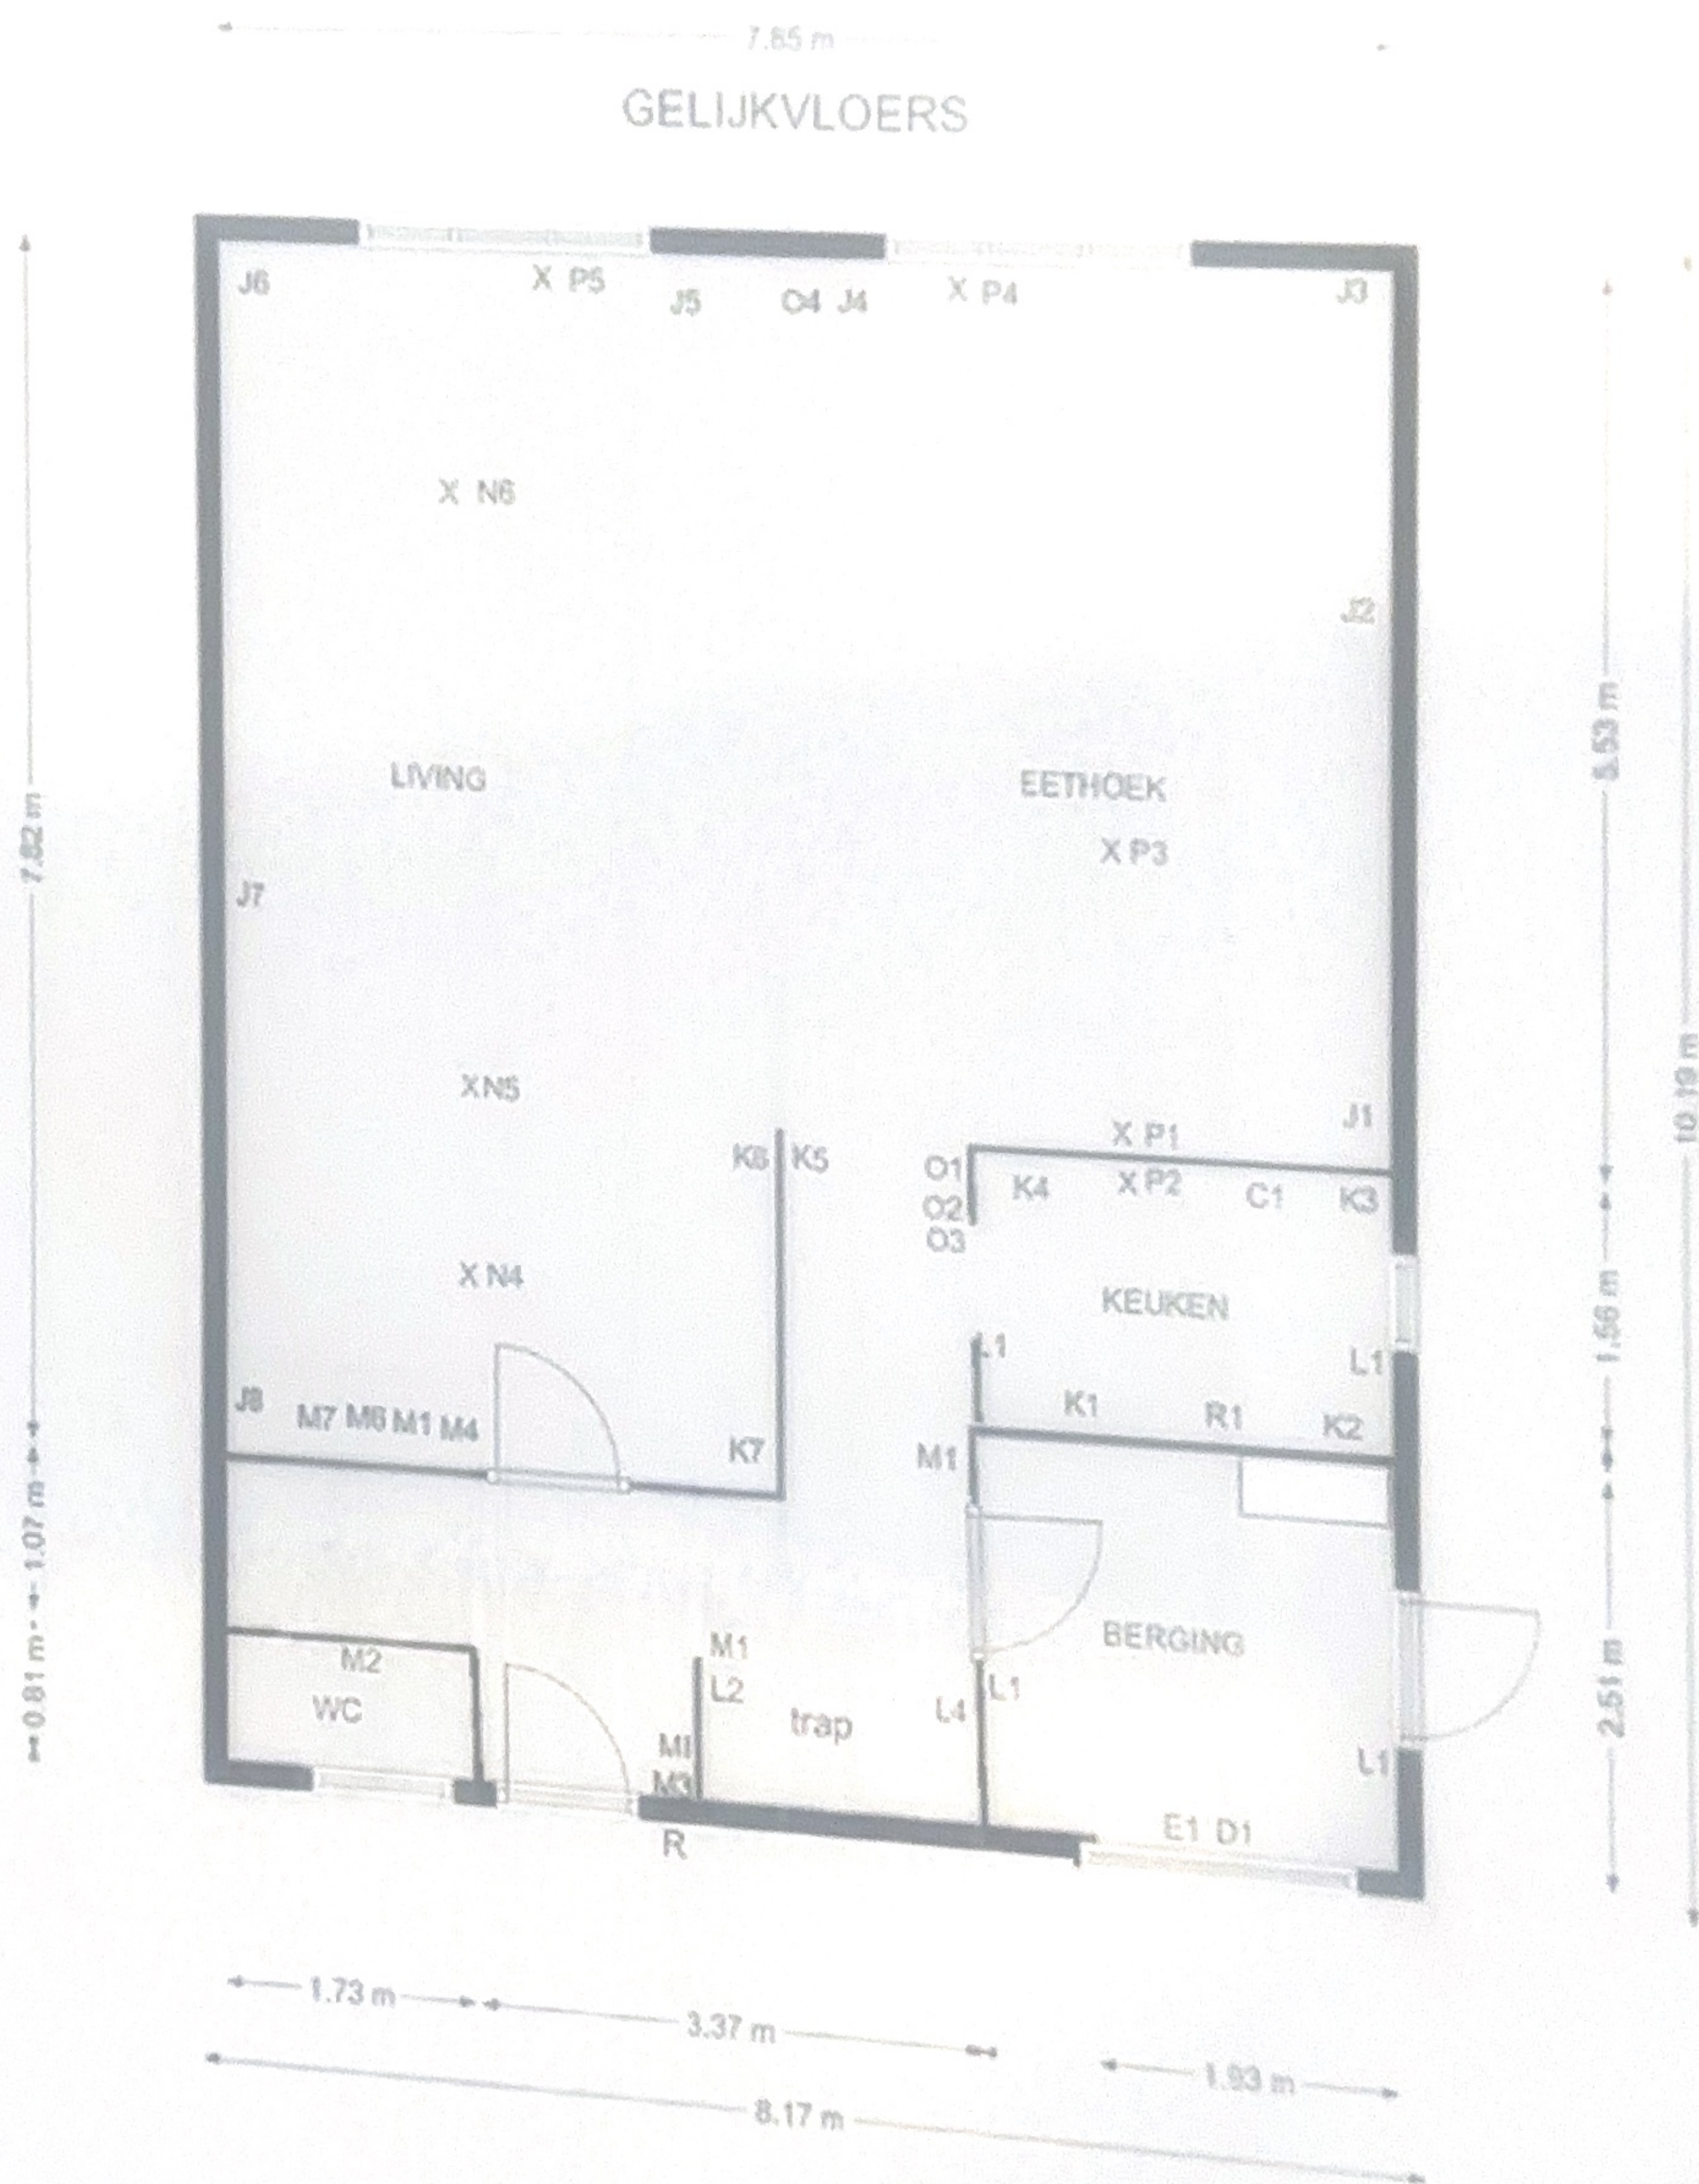

Blad 2/6




DROOGKRAST

OVEN

1ste VERDIEPING


Blad 2/6

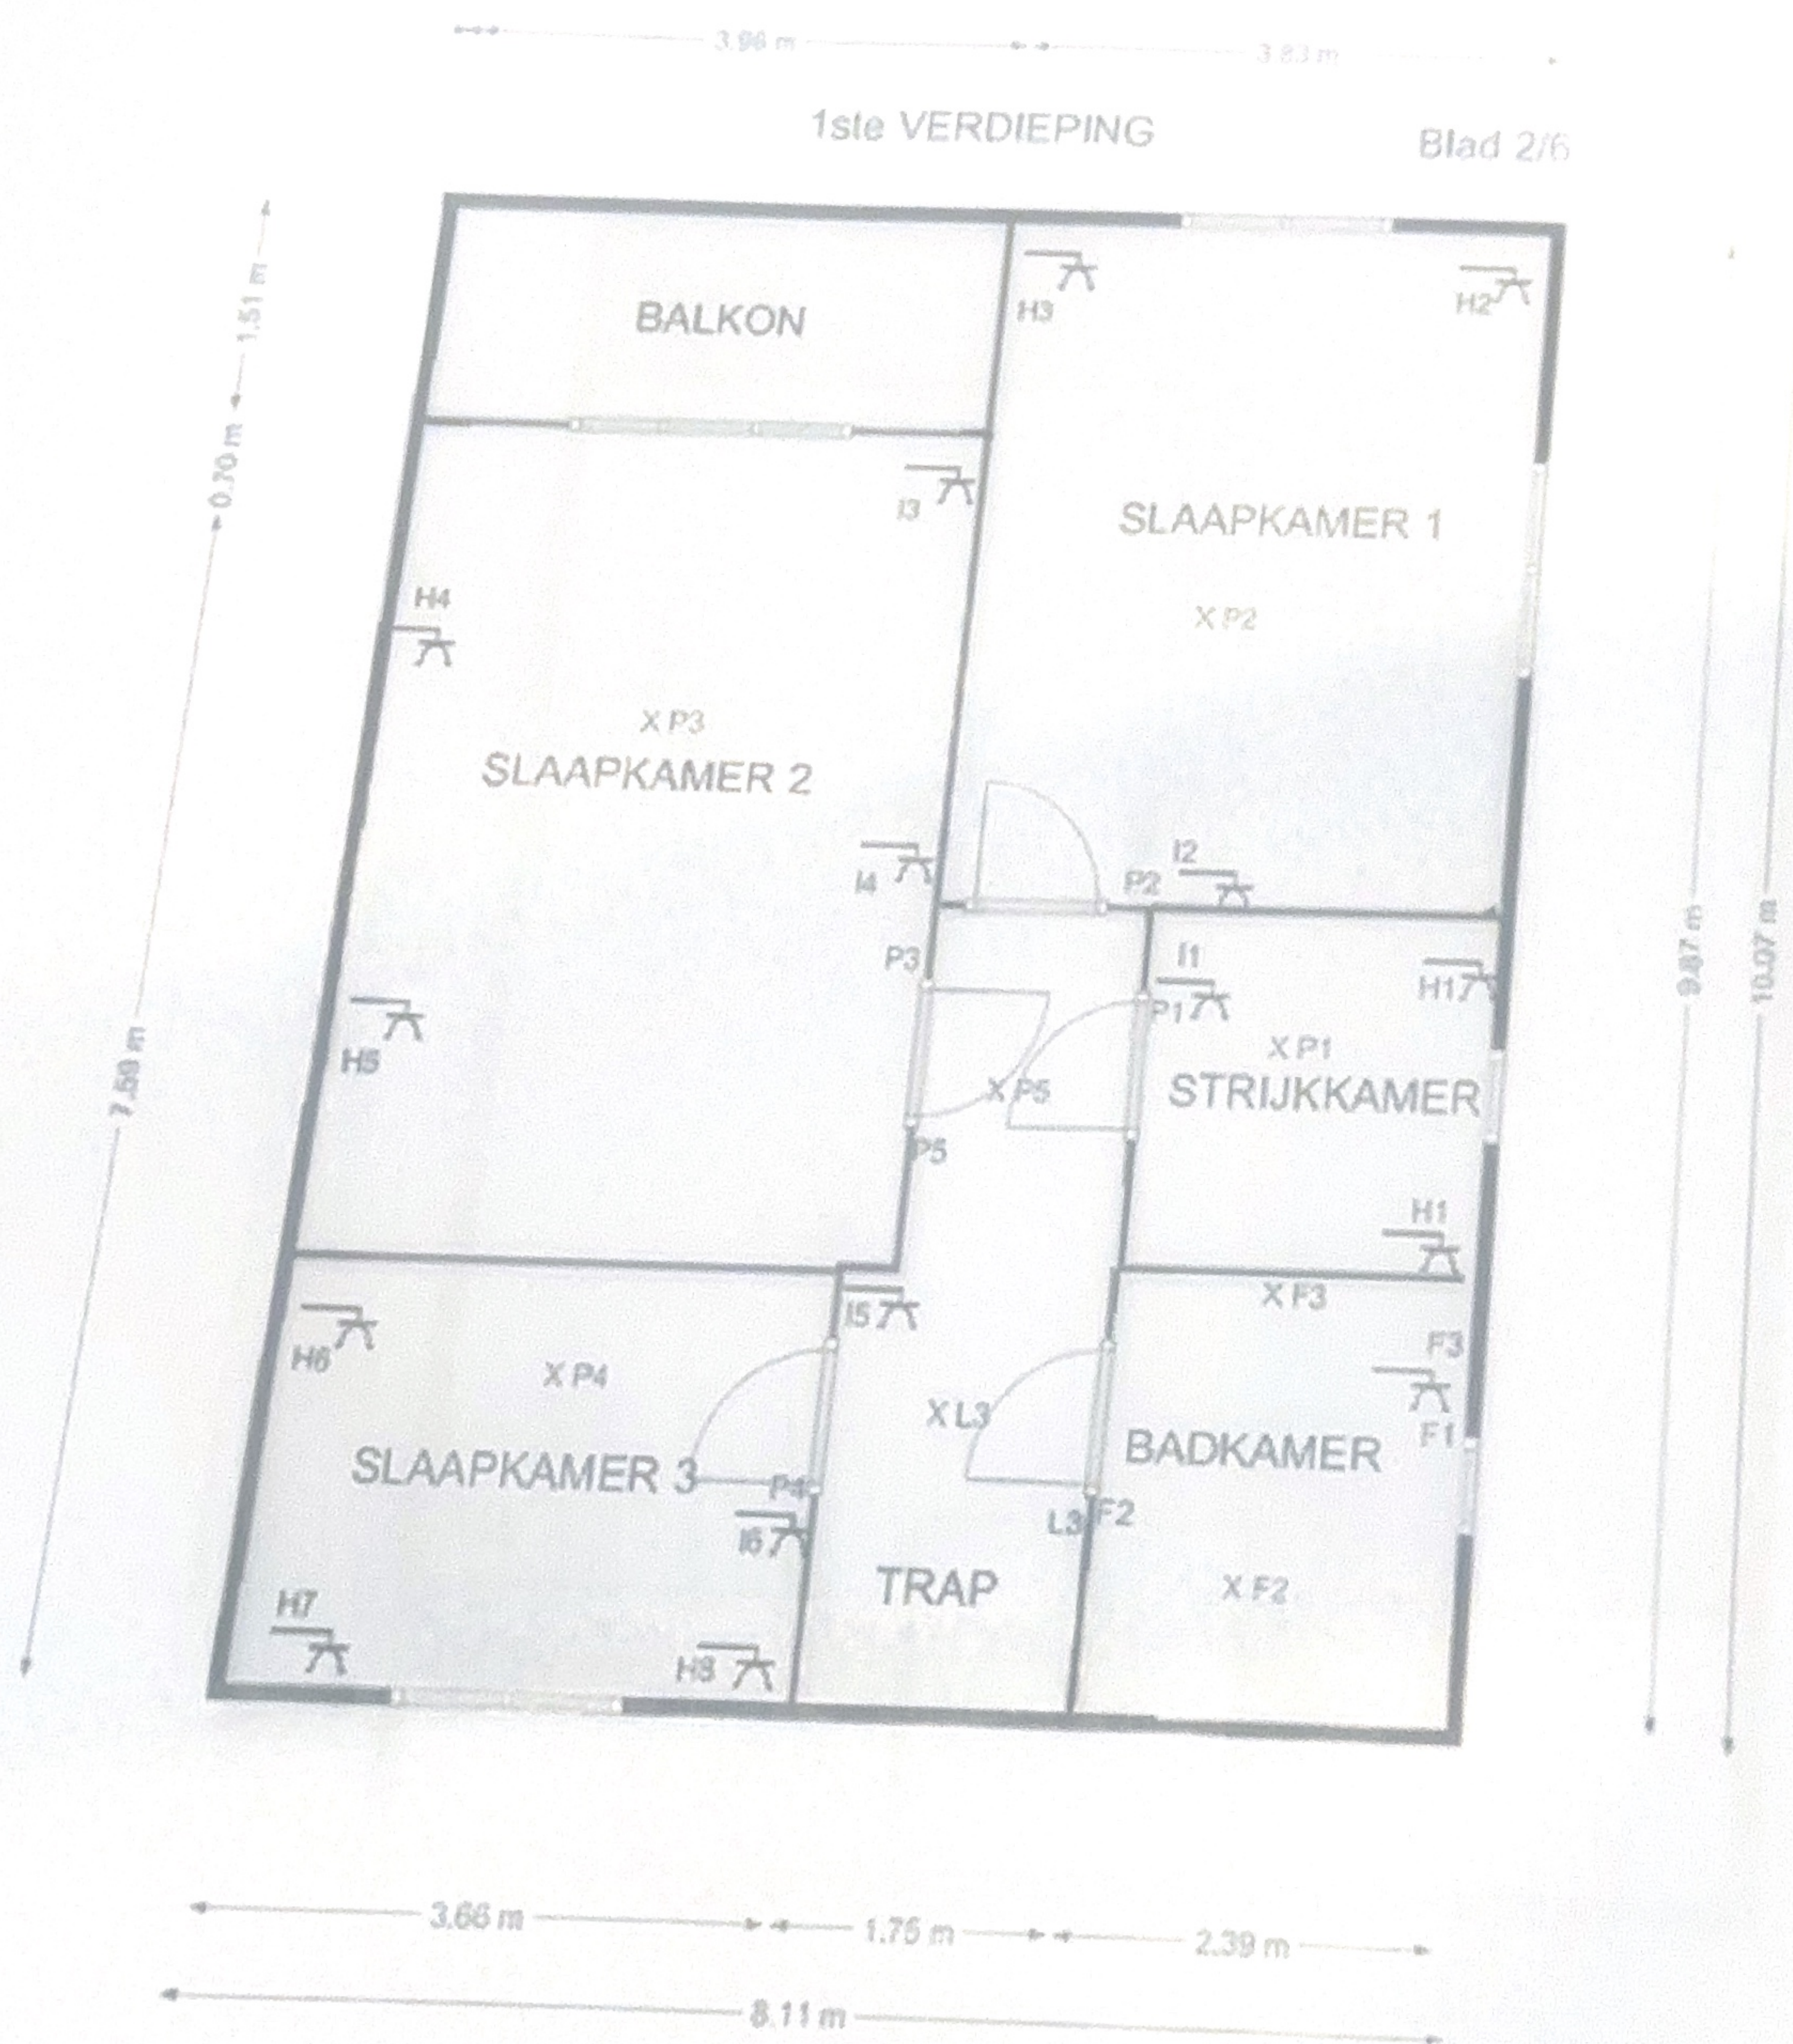


P1

Blad 3/6

Zolder

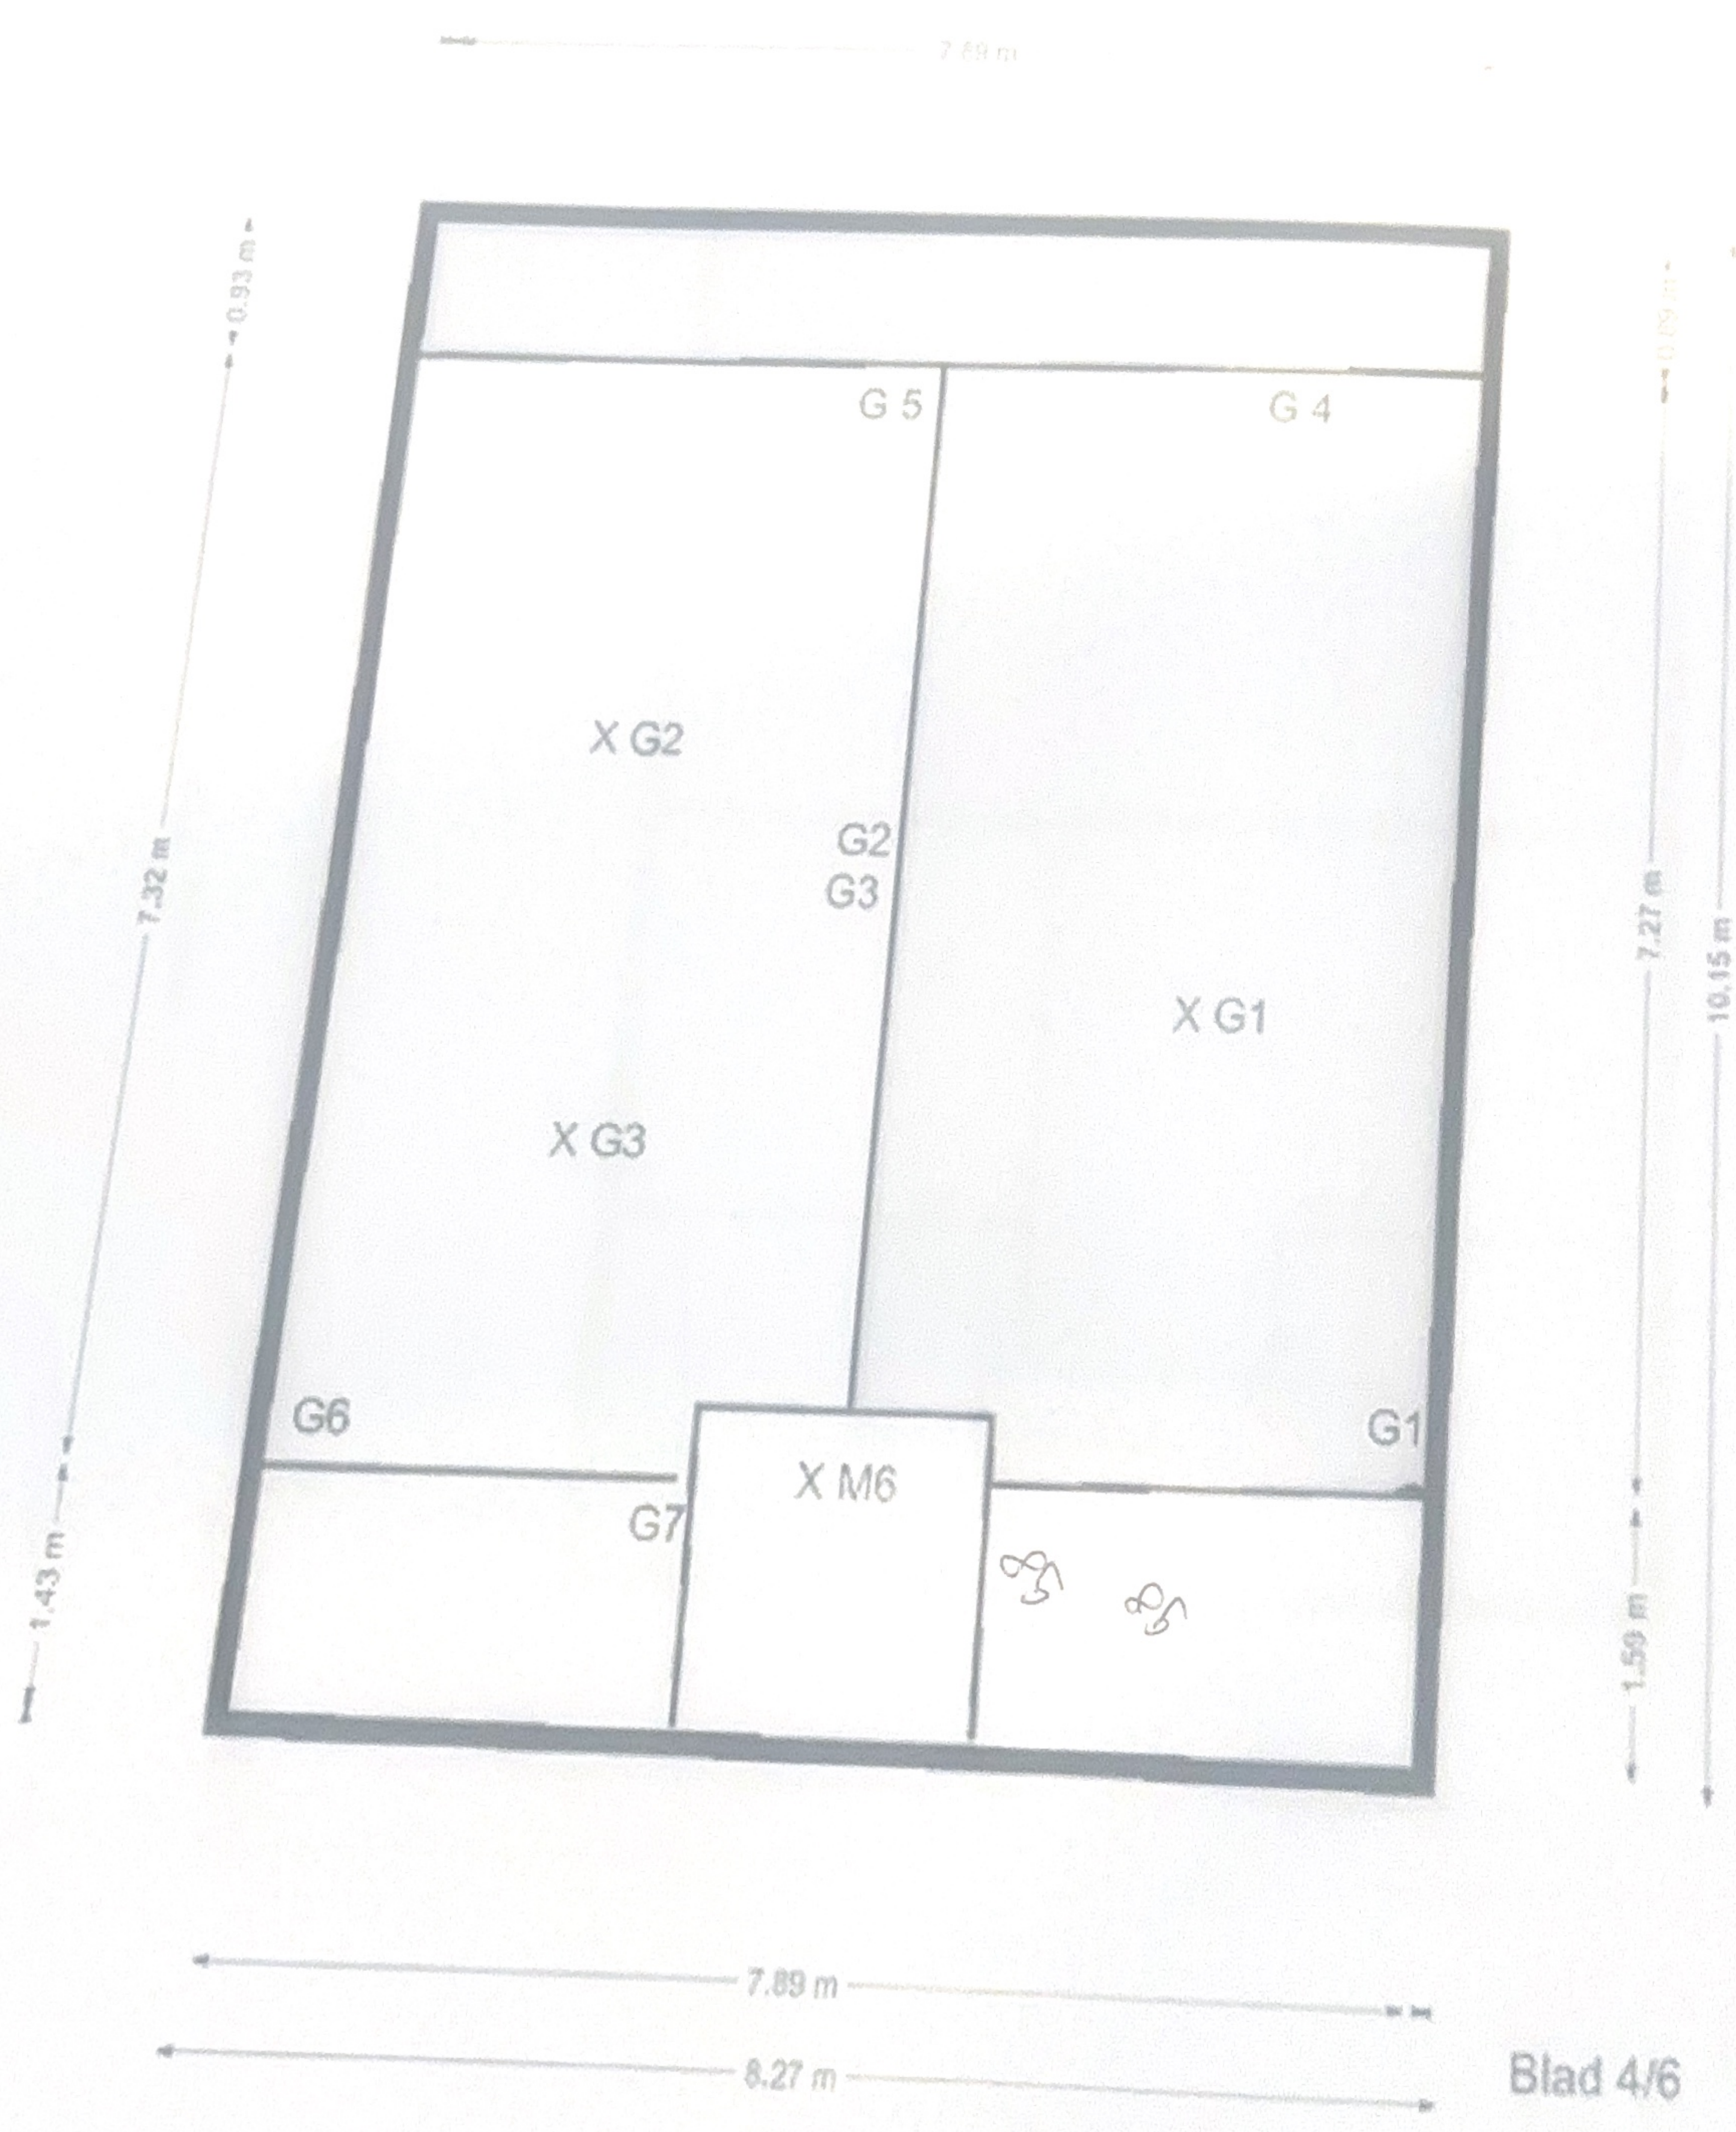

garage

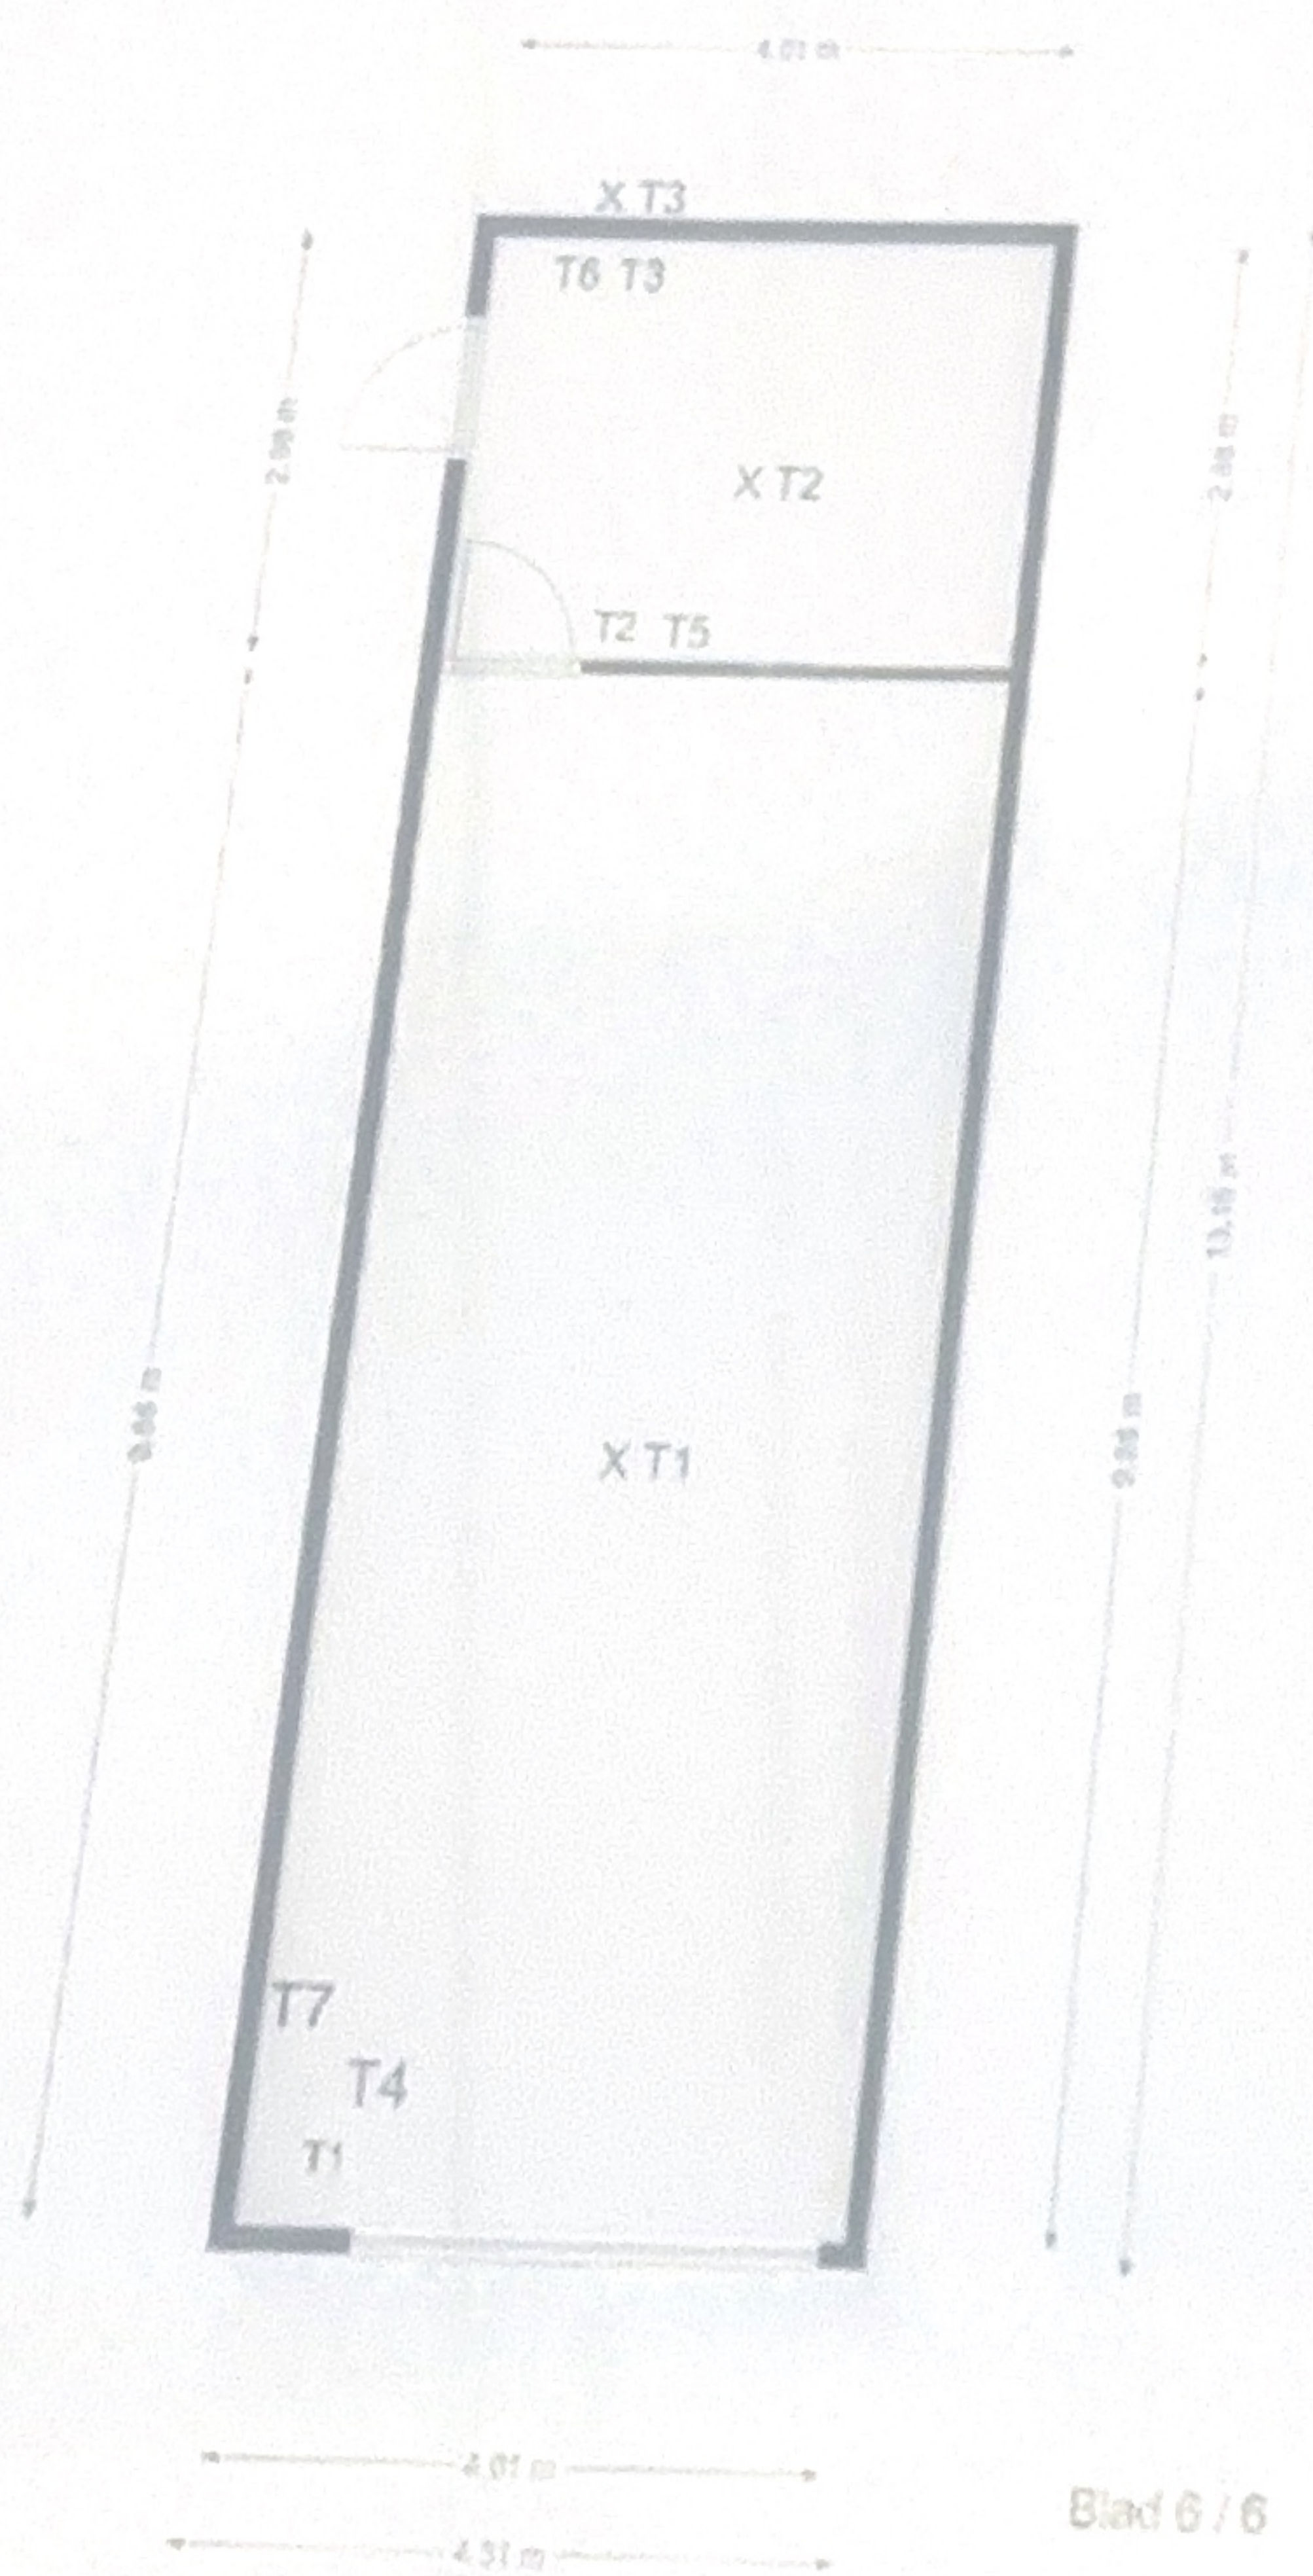

Blad 6/6

